




CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FISICO FINANCEIRO

REFORMA E ADEQUAÇÃO - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE IPORA - GO

INÍCIO (O.S.)		15 à 31 Julho	01 à 15 Agosto	16 à 31 Agosto	01 à 15 Setembro	16 à 30 Setembro	01 à 15 Outubro
		MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
MARCOS REALIZADOS	Julho/21 a Outubro/21						
% EXECUTADO NO PERÍODO	97,00%						
MARCOS PLANEJADOS	Julho/21 a Outubro/21	31/jul	15/ago	31/ago	15/set	30/set	15/out
PLANEJADO ACUMULADO		16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%
EXECUTADO ACUMULADO		16,60%	16,00%	16,00%	15,00%	15,00%	14,00%
PLANEJADO MENSAL		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%
DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO		0,00%	1,60%	1,60%	0,00%	1,60%	1,60%

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total - Obra	julho	agosto	agosto	setembro	setembro	outubro	TOTAL FATURADO
1.0	Processo 2020000614	R\$ 448.000,00	Demolições Gerais, Retirada de Bancadas e Desinstalações da Rede Elétrica.	Reenquadramento de Janelas, portas e portais, início das instalações elétricas e revisão das instalações hidrosanitárias. Infraestrutura de Cobertura/Telhado, instalações de portas, portais e janelas, adequação em alvenaria dos setores.		Infraestruturas de rede, elétrica, hidráulica, ar condicionado e CFTV. Revestimentos em geral.	Início do emassamento e pinturas e qualificação da parte externa da edificação. Instalações gerais, revisão fachada, e estruturas externas com entrega da obra.		
2.0			Medições Faturadas	R\$ 74.666,66	R\$ 74.666,66	R\$ 74.666,66	R\$ 74.666,66	R\$ 74.666,66	R\$ 74.666,66

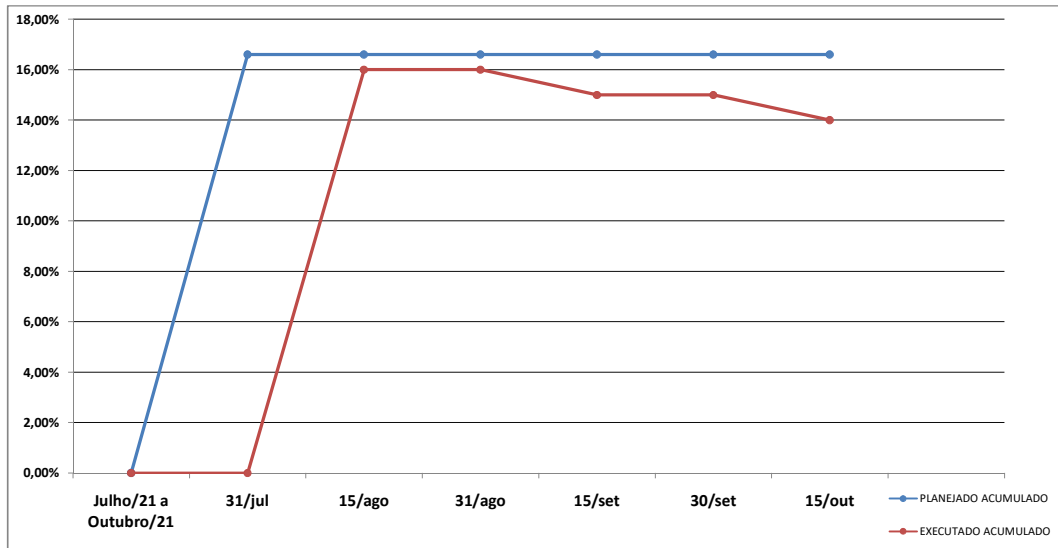

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE IPORÁ - GO

