


CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FISICO FINANCEIRO REFORMA E ADEQUAÇÃO - HEMOCENTRO ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE I - RIO VERDE

INICIO (O.S.)		10 à 31 Janeiro	01 à 28 Fevereiro	01 à 31 Março	01 à 30 Abril	01 à 31 Maio	01 à 30 Junho
		MEDIÇÃO NO PERÍODO					
MARCOS REALIZADOS	Janeiro/22 a Junho/22	31/jan	28/fev	31/mar	30/abr	31/mai	30/jun
% EXECUTADO NO PERÍODO	Início da obra.	20,53%					
MARCOS PLANEJADOS	Acumulado	31/01	28/02	31/03	30/04	31/05	30/06/2022
PLANEJADO ACUMULADO		16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	86,67%	100,00%
EXECUTADO ACUMULADO		64,32%	34,20%	49,26%	64,32%	0,00%	0,00%
DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO		47,65%	-0,37%	-0,74%	-2,35%	-86,67%	-100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total - Obra	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1.0	INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE RIO VERDE.	R\$ 1.029.200,00						
2.0	ADITIVO CONTRATUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para REFORMA DA RECEPÇÃO. (REALINHAMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DA REDE HEMO)	R\$ 267.412,06	Demolições Gerais, Retirada de Bancadas e Desinstalações da Rede Elétrica.	Demolições Gerais, Retirada de Bancadas e Desinstalações da Rede Elétrica.	Recepção central, piso superior, demolição, forro acartonado, rede elétrica.	Recepção central, piso inferior, demolição, forro acartonado, rede elétrica.		
3.0	TOTAL (VALOR GLOBAL) ITEM 3.0 = ITEM 1.0 + ITEM 2.0	R\$ 1.296.612,06						
4.0	Medições Faturadas		R\$ 211.331,96	R\$ 232.158,39	R\$ 195.236,55	R\$ 195.236,55	R\$ -	R\$ -

Acumulado Previsto vs Realizado

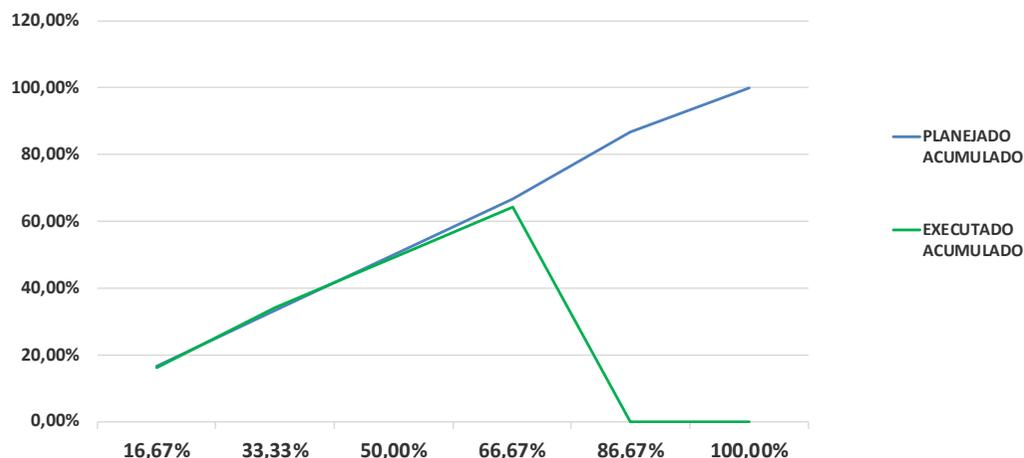

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HEMOCENTRO ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE I - RIO VERDE

